



Implementat de

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova

Activități în cadrul proiectului în Zona de Management a
Deșeurilor 8 (ZMD 8) din Regiunea de Dezvoltare Nord
(r-le Edineț, Dondușeni, Briceni, Edineț)

Ședința ordinară a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord
Bălți, 27.09.2017



In cooperation with





Cuprins

- I. Activități desfășurate în cadrul proiectului ZMD 8.
- II. Investiții propuse prin proiect.
- III. Schema de gestionare a deșeurilor în ZMD 8.
- IV. Planul de investiții.
- V. Provocări și probleme.



Schimbarea destinației terenurilor Amplasament Dondușeni

Activitate	Stadiu
Actul de selectare a terenului, care să cuprindă conturul investigat, semnat de către Comisie	Finalizat
Planul de selectare a terenului coordonat cu Urbanproiect	Finalizat
Formarea bunului imobil prin separarea b.i. nr. cad. 3401104120, în hotare determinate de Planul general de amenajare a teritoriului	Decizia CL din 29.03.2017 cu privire la formarea BI prin separare, proces finalizat
Înregistrarea bunului imobil format în RBI	Este atribuit numărul cadastral 3401104236. Va fi înregistrat după Decizia CL privind servituta drumul de acces



Schimbarea destinației terenurilor Amplasament Edineț

Activitate	Stadiu
Formarea bunului imobil în hotare determinate de Planul general de amenajare a teritoriului	Finalizat
Înregistrarea bunului imobil formate la OCT	Inițiat
Declararea lucrărilor de construcției ST de utilitate publică, interes comun, în conformitate cu Legie nr. 488 din 08.07.1999	Nu s-a realizat



Schimbarea destinației terenurilor Amplasament Briceni

Activitate	Stadiu
Adoptarea deciziei Consiliului local privind atribuirea terenului în folosință pentru construcția ST	După realizarea investiției



Elaborarea Studiului de Fezabilitate

Activități desfășurate:

- Revizuirea prognozei de generare a deșeurilor, a analizei de opțiuni și a designului conceptual ca urmare a publicării de date noi privind populația (rezultatele recensământul din 2014);
- Calculul costurilor de investiții;
- Calculul costurilor de operare;
- Analiza economico-financiară;
- Evaluarea socio-economică și de mediu;
- Finalizare analiza economică și financiară și analiza de risc;
- Aspecte instituționale.



Evaluarea impactului asupra mediului

Activități desfășurate:

- A fost contractată compania care a asigurat suport în derularea procedurii EIM;
- S-a stabilit inițiatorul activității și persoana de contact;
- A fost elaborată și depusă Cererea și Programul pentru activitatea planificată;
- A fost elaborată Documentația privind EIM.



Investiții propuse prin proiect

- Achiziționarea de recipiente și autospeciale pentru colectarea separată a deșeurilor municipale;
- Construirea a trei stații de transfer: Edineț, Briceni și Dondușeni (doar pentru deșeuri reciclabile);
- Construirea unei stații de sortare la Edineț (doar pentru deșeuri reciclabile);
- Construirea unei stații de compostare a deșeurilor verzi la Dondușeni;
- Construirea depozitului regional de deșeuri solide la Dondușeni.



Investiții propuse prin proiect

Containere și autospeciale pentru colectarea deșeurilor reziduale

Raion	Containere 1.1 m ³	Pubele 120 l	Containere 4 m ³ (DCD)
Dondușeni	736	1.121	4
Briceni	1.406	1.680	4
Edineț	578	2.170	4
Ocnia	573	2.226	4
Total	3.292	7.197	16

Raion	Autospeciale 16 m ³	Autospeciale 10 m ³
Dondușeni	1	2
Briceni	3	2
Edineț	2	2
Ocnia	2	4
Total	8	10



Investiții propuse prin proiect

Containere și autospeciale pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile


Raion	Containere 1.1 m ³	Autospeciale 16 m ³
Dondușeni	244	0
Briceni	447	0
Edineț	527	1
Ocnița	337	0
Total	1.555	1



Schema de gestionare a deșeurilor

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor in Zona de Management Deșeurilor 8, Regiunea de Dezvoltare Nord
Fluxul de gestionare a deșeurilor, 2021

ZMD 8, Regiunea de Dezvoltare Nord
Cantitatea totala de deșeuri municipale generate= 40113 t/an (13851 t/an in zona urbana si 26262 t/an in zona rurala)

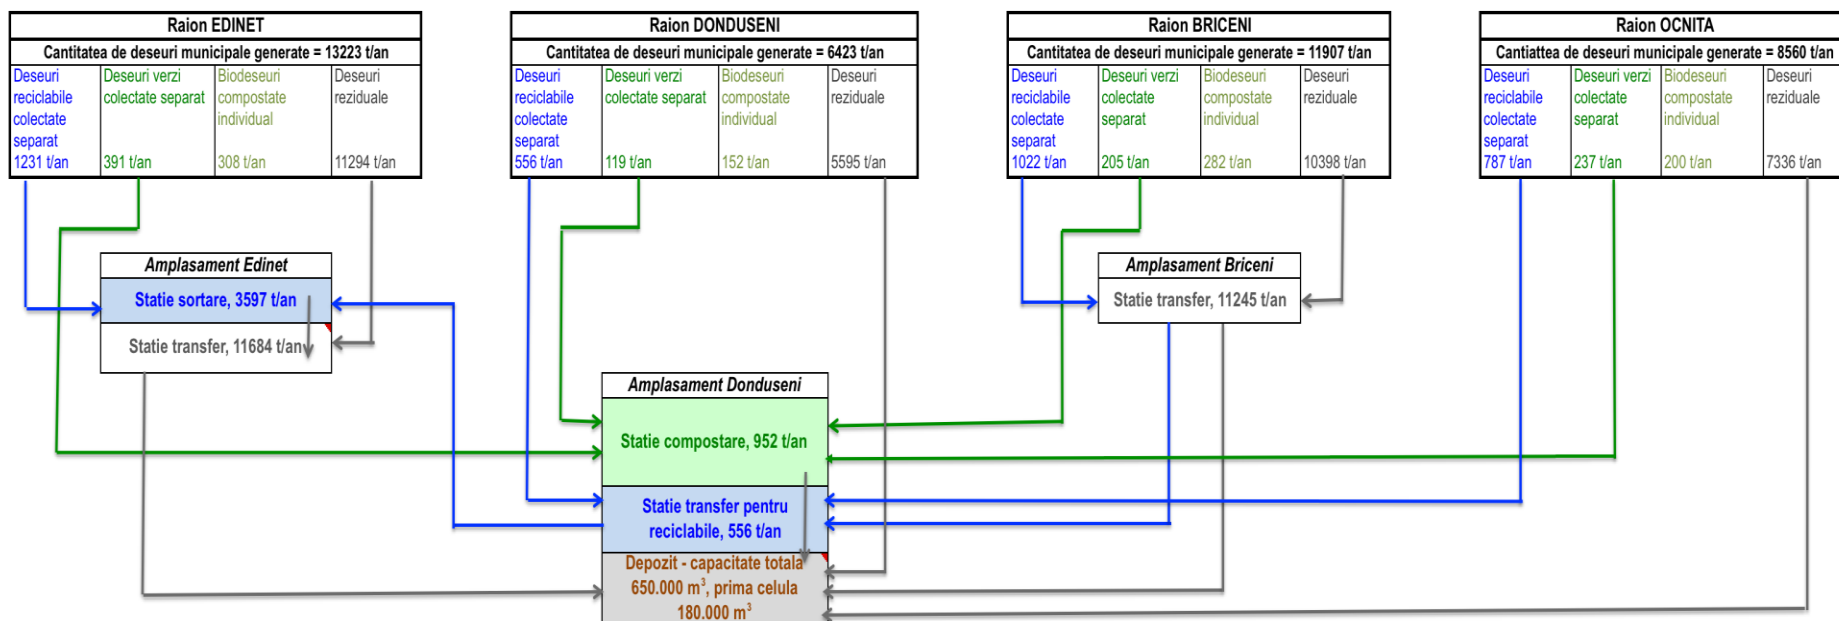



Acțiuni imediate planificate

- Studiul de Fezabilitate (SF) și Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) au fost elaborate. La etapa actuală are loc finalizarea traducerii SF în limba de stat, ulterior ambele documente fiind transmise tuturor APL de nivelul I și II beneficiare din ZMD 8;
- Va fi prezentată pentru APL din ZMD 8 informația cu privire la desfășurarea procesului de EIM a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Solide din ZMD 8 din cadrul SF;
- În luna octombrie 2017 urmează să aibă loc consultările publice pe marginea Evaluării Impactului asupra Mediului cu cetățenii din or. Dondușeni și alte localități beneficiare din raion.



Provocări și probleme or. Edineț

- În ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Edineț din 21.07.2017 au fost incluse spre examinare proiectele de decizie cu privire la “*aprobarea procesului-verbal al comisiei de declarare a lucrărilor de utilitate publică pentru terenul*” și “*schimbarea destinației terenului*”, propuse de Primarul mun. Edineț Constantin Cojocari;
- În cadrul acestei ședințe a CM Edineț, ambele proiecte au acumulat doar 6 *voturi pro* și 13 *voturi contra*, din totalul de 19 consilieri prezenți la ședință;
- Mai mult, la inițiativa unor consilieri, în cadrul acestei ședințe a fost examinat și votat un proiect de decizie prin care a fost abrogată Decizia CL Edineț nr. 13/10 din 14.12.2016 „Cu privire la selectarea terenului pentru amplasarea Stației de transfer a deșeurilor menajere solide”. ***Astfel, prin luarea acestor decizii, CM Edineț a pus în pericol implementarea proiectului în ZMD 8 !***
- La 5 august 2017 consultanții regionali GIZ Igor Neaga și Vlad Ghițu au avut o întrunire cu unii consilieri ai CM Edineț unde au venit cu explicații și argumente vis-a-vis de poziția ostilă a majorității Consiliului față de proiect.



Provocări și probleme or. Dondușeni

- În cadrul discuțiilor și consultărilor neoficiale cu cetățenii reprezentanții APL I or. Dondușeni și CR Dondușeni au venit cu argumente în favoarea implementării proiectului ZMD 8 și importanța investițiilor propuse (inclusiv construcția depozitului regional de deșeuri din or. Dondușeni);
- În această perioadă unii deputați PSRM din Parlament au inițiat un șir de contacte și întruniri cu cetățenii din or. Dondușeni și localitățile vecine, în cadrul cărora au promovat ideea că implementarea proiectului și construcția depozitului regional *reprezintă un mare pericol pentru sănătatea cetățenilor și protecția mediului;*
- La 23.08.2017 deputatul în Parlamentul RM Vladimir Odnostalco s-a adresat cu o interpelare către Prim-ministrul RM, MADRM, Comisiile parlamentare și CR Dondușeni, prin care a solicitat ca să fie întreprinse măsurile necesare pentru ***selectarea altui teren pentru depozitul regional de deșeuri și staiei de compostare a deșeurilor verzi în locul celor din Dondușeni.***
- La 09.09.2017 în or. Dondușeni a fost organizată o acțiune de protest cu participarea unor deputați la care iarăși a fost abordată această problemă.



Provocări și probleme

Concluzii:

- Majoritatea consilierilor din CM Edineț, fără să facă cunoștință cu soluțiile propuse în SF și rezultatele / argumentele din EIM, au luat decizii pripite și, considerăm noi, nefondate;
- Unii parlamentari și lideri locali din r-l Dondușeni, de asemenea, fără a lua cunoștință de toate prevederile stipulate în SF și EIM, în mod arbitrar au pornit o campanie ostilă față de proiectul din ZMD 8.

Ce acțiuni trebuie întreprinse la nivle regional / zonal (ZMD 8) ?

- ***Ce acțiuni trebiue întreprinse de către factorii de decizie pentru a soluționa problemele existente ?***
- ***Ce acțiuni poate întreprinde CRD Nord ?***



În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.

Publicat de

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania

Proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova"

Chișinău, str. Bernardazzi 66

T + 373 22 22-83-19

F + 373 22 00-02-38

I www.giz.de, www.serviciilocale.md

**Mulțumesc pentru
atenție!**

Proiect cofinanțat de



27/09/2017



Sedința de lucru CDL



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC
Agenția Elvețiană pentru
Dezvoltare și Cooperare

În cooperare cu



MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI

Page 16
